Project:000 IKC APP LANGERAAR
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop
Datum: 2-2-2024

000 IKC APP LANGERAAR
05 UITVOERINGSSCHEMA

VINK BOUW

Regel	Naam	Start	Eind	Duur
1	**Contract en gegevens**	**10-10-2023**	**22-4-2024**	**128d**
2	Aannemingsovk	10-10-2023	24-10-2023	14vd
3	Bouwvergunning onherroepelijk	24-10-2023	24-10-2023	1d
4	NUTS tbv bouwvoorzieningen gereed	24-10-2023	24-10-2023	1d
5	Werktekeningen bouwkundig en constructief	24-10-2023	4-12-2023	30d
6	Maatgevende voorbereidingselement ruwbouw	31-10-2023	7-3-2024	83d
7	Maatgevende voorbereidingselement gevel	31-10-2023	22-4-2024	113d
8	**IKC de POEL**	**28-3-2024**	**17-4-2025**	**241d**
9	Omleggen Riool en verwijderen bestaand riool	28-3-2024	12-4-2024	10d
10	Sonderingen maken	8-4-2024	12-4-2024	5d
11	Ontgraven bouwkuipen vervoeren naar depot	15-4-2024	19-4-2024	5d
12	Aanbrengen keerwanden	15-4-2024	26-4-2024	10d
13	Grondwerk, ontgraven, vervoeren en afwerken	22-4-2024	14-5-2024	15d
14	Rioolaansluitingen nieuwbouw	22-4-2024	3-5-2024	10d
15	Kabelwerkzaamheden	6-5-2024	22-5-2024	10d
16	Aanbrengen Funderingslagen 3500m2	16-5-2024	30-5-2024	10d
17	**Onderbouw**	**23-5-2024**	**28-6-2024**	**27d**
18	Inrichten bouwterrein	23-5-2024	29-5-2024	5d
19	Heiwerk	30-5-2024	5-6-2024	5d
20	Poeren, putten en balken inclusief kimmen	6-6-2024	19-6-2024	10d
21	Installaties onder BG aanbrengen	13-6-2024	21-6-2024	7d
22	Kanaalplaatvloeren leggen en afstorten naden	24-6-2024	28-6-2024	5d
23	Ankerplan en mallen staal stellen	27-6-2024	3-7-2024	5d
24	Gymzaal vloer ihw storten	2-7-2024	15-7-2024	10d
25	Druklaag begane grondvloer storten	4-7-2024	17-7-2024	10d
26	Mobiele kraan	24-6-2024	17-2-2025	141d
27	Steiger	6-9-2024	14-3-2025	126d
28	**Ruwbouw**	**19-8-2024**	**19-11-2024**	**67d**
29	Stelwerk kalkzandsteen begane	19-8-2024	23-8-2024	5d
30	Kalkzandsteen lijmen begane grond	26-8-2024	13-9-2024	15d
31	Kalkzandsteen rondingen blokjes lijmen handzaam	6-9-2024	19-9-2024	10d
32	Staalconstructie plaatsen incl. onderst + gym	6-9-2024	19-9-2024	10d
33	Steigerwerk rondom begane	6-9-2024	19-9-2024	10d
34	Kanaalplaatvloeren leggen 1ste verd.	20-9-2024	3-10-2024	10d
35	Galerijplaten leggen + Trap Bin + Trap Bui	4-10-2024	7-10-2024	2d
36	Druklaag storten 1ste verdieping + stukje vide	4-10-2024	17-10-2024	10d
37	Steigerwerk rondom 1ste verd.	4-10-2024	17-10-2024	10d
38	Druklaag dak 1ste verd. Lage dak	11-10-2024	17-10-2024	5d
39	Stelwerk kalkzandsteen verdieping	18-10-2024	24-10-2024	5d
40	Kalkzandsteen lijmen 1ste verd.	25-10-2024	14-11-2024	15d
41	Kalkzandsteen rondingen blokjes lijmen handzaam	6-11-2024	19-11-2024	10d
42	Staalconstructie plaatsen incl. onderst. + Gym	6-11-2024	19-11-2024	10d
43	Randbeveiliging en netten Staalcon. Gym	8-11-2024	19-11-2024	8d
44	Kanaalplaatvloerenleggen 2de + dak gym staal	20-11-2024	26-11-2024	5d
45	Dak gymzaal staal	20-11-2024	26-11-2024	5d
46	Staalconstructie pootjes Opdak (lucht)	27-11-2024	28-11-2024	2d
47	Druklaag storten dak	29-11-2024	5-12-2024	5d
48	Staalconstructie opdak (lucht) + kooi	6-12-2024	12-12-2024	5d
49	**Gevels en dak**	**1-10-2024**	**28-1-2025**	**76d**
50	Stelkozijnen BG	1-10-2024	21-10-2024	15d
51	Stel, isoleer en Metselwerk BG	14-10-2024	6-12-2024	40d
52	Stelkozijnen 1e verdieping	27-11-2024	17-12-2024	15d
53	Stel, isoleer en Metselwerk 1e	2-12-2024	17-1-2025	25d
54	Stel en Metselwerk opdak (lucht)	6-12-2024	16-1-2025	20d
55	Ytong lijmen lage dak	18-10-2024	31-10-2024	10d
56	Ytong lijmen hoge dak	6-12-2024	12-12-2024	5d
57	Isolatie en dakbedekking aanbrengen lage dak	1-11-2024	14-11-2024	10d
58	Lichtkoepels en dakluik montage	6-12-2024	11-12-2024	4d
59	Isolatie en dakbedekking aanbrengen hoge dak	13-12-2024	7-1-2025	8d
60	Demontage steiger begane grond KDV	15-11-2024	21-1-2025	38d
61	Hekwerken monteren Galerij	22-1-2025	28-1-2025	5d
62	Dakveiligheid-kanalen-zonnepanelen	8-1-2025	14-1-2025	5d
63	**Installaties**	**18-10-2024**	**4-4-2025**	**111d**
64	WTW kanaalwerk onder ruwe vloer Lage dak	18-10-2024	14-11-2024	20d
65	WTW kanaalwerk onder ruwe vloer hoge dak	6-12-2024	9-1-2025	15d
66	Kabelgoot lage dak	28-10-2024	22-11-2024	20d
67	Kabelgoot hoge dak	13-12-2024	16-1-2025	15d
68	Installaties aftekenen wanden	20-11-2024	10-12-2024	15d
69	Fraiswerk wanden	27-11-2024	17-12-2024	15d
70	Aanbrengen installaties	4-12-2024	14-1-2025	20d
71	Lift	9-12-2024	20-12-2024	10d
72	Leidingwerk intern (meterkast-kabelgoot)	16-12-2024	24-1-2025	20d
73	NUTS invoeren	27-1-2025	14-3-2025	35d
74	Inregelen en stoken	17-3-2025	4-4-2025	15d
75	**Afbouw**	**15-11-2024**	**31-3-2025**	**87d**
76	Standleidingen aanbrengen	15-11-2024	6-2-2025	50d
77	Isolatie vloerverwarming	26-11-2024	17-2-2025	50d
78	Vloerverwarming	29-11-2024	20-2-2025	50d
79	Dekvloeren aanbrengen 1000m²/keer	6-12-2024	27-2-2025	50d
80	MS wanden 1 zijde open houden	12-12-2024	5-3-2025	50d
81	MS wanden Sluiten en plafonds	16-12-2024	7-3-2025	50d
82	Kozijn natte cellen	18-12-2024	11-3-2025	50d
83	Tegelwerk wanden en vloeren	20-12-2024	13-3-2025	50d
84	Binnendeurkozijn en deuren	7-1-2025	17-3-2025	50d
85	Wanden glasvlies en schilderwerk	9-1-2025	19-3-2025	50d
86	Vloerafwerkingen	13-1-2025	21-3-2025	50d
87	Vloer Gymzaal	15-1-2025	25-3-2025	50d
88	Meubels, sanitaire toestellen	17-1-2025	27-3-2025	50d
89	Afmonteren installaties	21-1-2025	31-3-2025	50d
90	**Opleveren**	**7-4-2025**	**17-4-2025**	**9d**
91	Opleveren	7-4-2025	9-4-2025	3d
92	Narooien	10-4-2025	16-4-2025	5d
93	Sleuteloverdracht	17-4-2025	17-4-2025	1d
94	**APPARTEMENTEN**	**30-5-2024**	**29-4-2025**	**207d**
95	**ONDERBOUW**	**30-5-2024**	**19-7-2024**	**37d**
96	Inrichten bouwterrein	30-5-2024	5-6-2024	5d
97	Heiwerk	6-6-2024	12-6-2024	5d
98	Poeren, putten en balken inclusief kimmen	13-6-2024	26-6-2024	10d
99	Installaties onder BG aanbrengen	27-6-2024	3-7-2024	5d
100	Kanaalplaatvloer leggen begane	4-7-2024	19-7-2024	12d
101	Mobiele kraan	4-7-2024	27-2-2025	141d
102	**RUWBOUW**	**19-8-2024**	**2-10-2024**	**33d**
103	Begane grond wanden CLT	19-8-2024	21-8-2024	3d
104	Begane grond HSB gevels	22-8-2024	23-8-2024	2d
105	Begane grond Prefab badkamers	22-8-2024	26-8-2024	3d
106	Begane grond Steigerbouwen	22-8-2024	27-8-2024	4d
107	1ste verdieping vloer CLT	28-8-2024	29-8-2024	2d
108	1ste verdieping wanden CLT	30-8-2024	3-9-2024	3d
109	1ste verdieping HSB gevels	4-9-2024	5-9-2024	2d
110	1ste verdieping Prefab badkamers	4-9-2024	6-9-2024	3d
111	1ste verdieping Steigerbouwen	4-9-2024	9-9-2024	4d
112	2de verdieping vloer CLT	10-9-2024	11-9-2024	2d
113	2de verdieping wanden CLT	12-9-2024	16-9-2024	3d
114	2de verdieping HSB gevels	17-9-2024	18-9-2024	2d
115	2de verdieping Prefab badkamers	17-9-2024	19-9-2024	3d
116	2de verdieping Steigerbouwen	17-9-2024	20-9-2024	4d
117	3de verdieping vloer CLT	23-9-2024	24-9-2024	2d
118	3de verdieping wanden CLT	25-9-2024	27-9-2024	3d
119	3de verdieping HSB gevels	30-9-2024	1-10-2024	2d
120	3de verdieping Prefab badkamers	30-9-2024	2-10-2024	3d
121	3de verdiping Steigerbouwen	3-10-2024	8-10-2024	4d
122	4de verdieping vloer CLT	9-10-2024	10-10-2024	2d
123	4de verdieping wanden CLT	11-10-2024	15-10-2024	3d
124	4de verdieping HSB gevels	16-10-2024	17-10-2024	2d
125	4de verdieping Prefab badkamers	16-10-2024	18-10-2024	3d
126	4de verdieping Steigerbouwen	16-10-2024	21-10-2024	4d
127	4de verdieping Vloer / Dak CLT	22-10-2024	23-10-2024	2d
128	Prefab liftkern en trappenhuis buiten bg	22-8-2024	27-8-2024	4d
129	Prefab liftkern en trappenhuis buiten 1ste	28-8-2024	2-9-2024	4d
130	Prefab liftkern en trappenhuis buiten 2de	10-9-2024	13-9-2024	4d
131	Prefab liftkern en trappenhuis buiten 3de	23-9-2024	26-9-2024	4d
132	Prefab liftkern en trappenhuis buiten 4de	9-10-2024	14-10-2024	4d
133	Prefab liftkern dak	22-10-2024	25-10-2024	4d
134	Houten kolommen, balkon en galerijen 1ste	30-8-2024	5-9-2024	5d
135	Houten kolommen, balkon en galerijen 2de	12-9-2024	18-9-2024	5d
136	Houten kolommen, balkon en galerijen 3de	25-9-2024	1-10-2024	5d
137	Houten kolommen, balkon en galijeren 4de	11-10-2024	17-10-2024	5d
138	**Gevels en dak**	**24-10-2024**	**6-2-2025**	**66d**
139	Dakrekken inclusief veiligheid	24-10-2024	6-11-2024	10d
140	Isolatie en dakbedekking aanbrengen	7-11-2024	27-11-2024	15d
141	Dakveiligheid-kanalen-zonnepanelen	28-11-2024	9-12-2024	8d
142	Metselwerk BG	24-10-2024	6-11-2024	10d
143	Geveltimmerwerk BG	24-10-2024	6-11-2024	10d
144	Metselwerk 1ste	7-11-2024	20-11-2024	10d
145	Geveltimmerwerk 1ste	7-11-2024	20-11-2024	10d
146	Metselwerk 2de	21-11-2024	4-12-2024	10d
147	Geveltimmerwerk 2de	21-11-2024	4-12-2024	10d
148	Metselwerk 3de	5-12-2024	18-12-2024	10d
149	Geveltimmerwerk 3de	5-12-2024	18-12-2024	10d
150	Metselwerk 4de	19-12-2024	15-1-2025	10d
151	Geveltimmerwerk 4de	19-12-2024	15-1-2025	10d
152	Demonter steiger	16-1-2025	29-1-2025	10d
153	Hekwerken monteren	17-1-2025	6-2-2025	15d
154	**Installaties**	**28-11-2024**	**27-3-2025**	**76d**
155	WKO ruimte bouwkundig gereed	28-11-2024	22-1-2025	30d
156	Lift	29-11-2024	9-1-2025	20d
157	Leidingwerk intern (meterkast-kabelgoot)	13-12-2024	23-1-2025	20d
158	NUTS invoeren	17-1-2025	20-2-2025	25d
159	Inregelen en stoken	21-2-2025	27-3-2025	25d
160	**Afbouw**	**28-11-2024**	**30-1-2025**	**36d**
161	Standleidingen aanbrengen	28-11-2024	8-1-2025	20d
162	Isolatie vloerverwarming	4-12-2024	14-1-2025	20d
163	Vloerverwarming	10-12-2024	20-1-2025	20d
164	Dekvloeren aanbrengen	17-12-2024	27-1-2025	20d
165	Binnendeur kozijnen	20-12-2024	30-1-2025	20d
166	Gipswerk wanden	13-1-2025	7-2-2025	20d
167	Spuitwerk plafonds	15-1-2025	11-2-2025	20d
168	Afmonteren installaties	17-1-2025	13-2-2025	20d
169	**Opleveren**	**28-3-2025**	**29-4-2025**	**21d**
170	Opleveren	28-3-2025	10-4-2025	10d
171	Narooien	11-4-2025	28-4-2025	10d
172	Sleuteloverdracht	29-4-2025	29-4-2025	1d
173	**Terrein**	**2-12-2024**	**9-5-2025**	**102d**
174	Buitenberging + Terrein Appartementen	2-12-2024	7-3-2025	60d
175	Terrein in profiel	16-12-2024	21-3-2025	60d
176	Terrein verhardingen aanbrengen	13-1-2025	4-4-2025	60d
177	Parkeervakken realiseren	28-1-2025	23-4-2025	60d
178	Groenvoorzieningen	5-2-2025	1-5-2025	60d
179	Terrein afwerking	12-2-2025	9-5-2025	60d

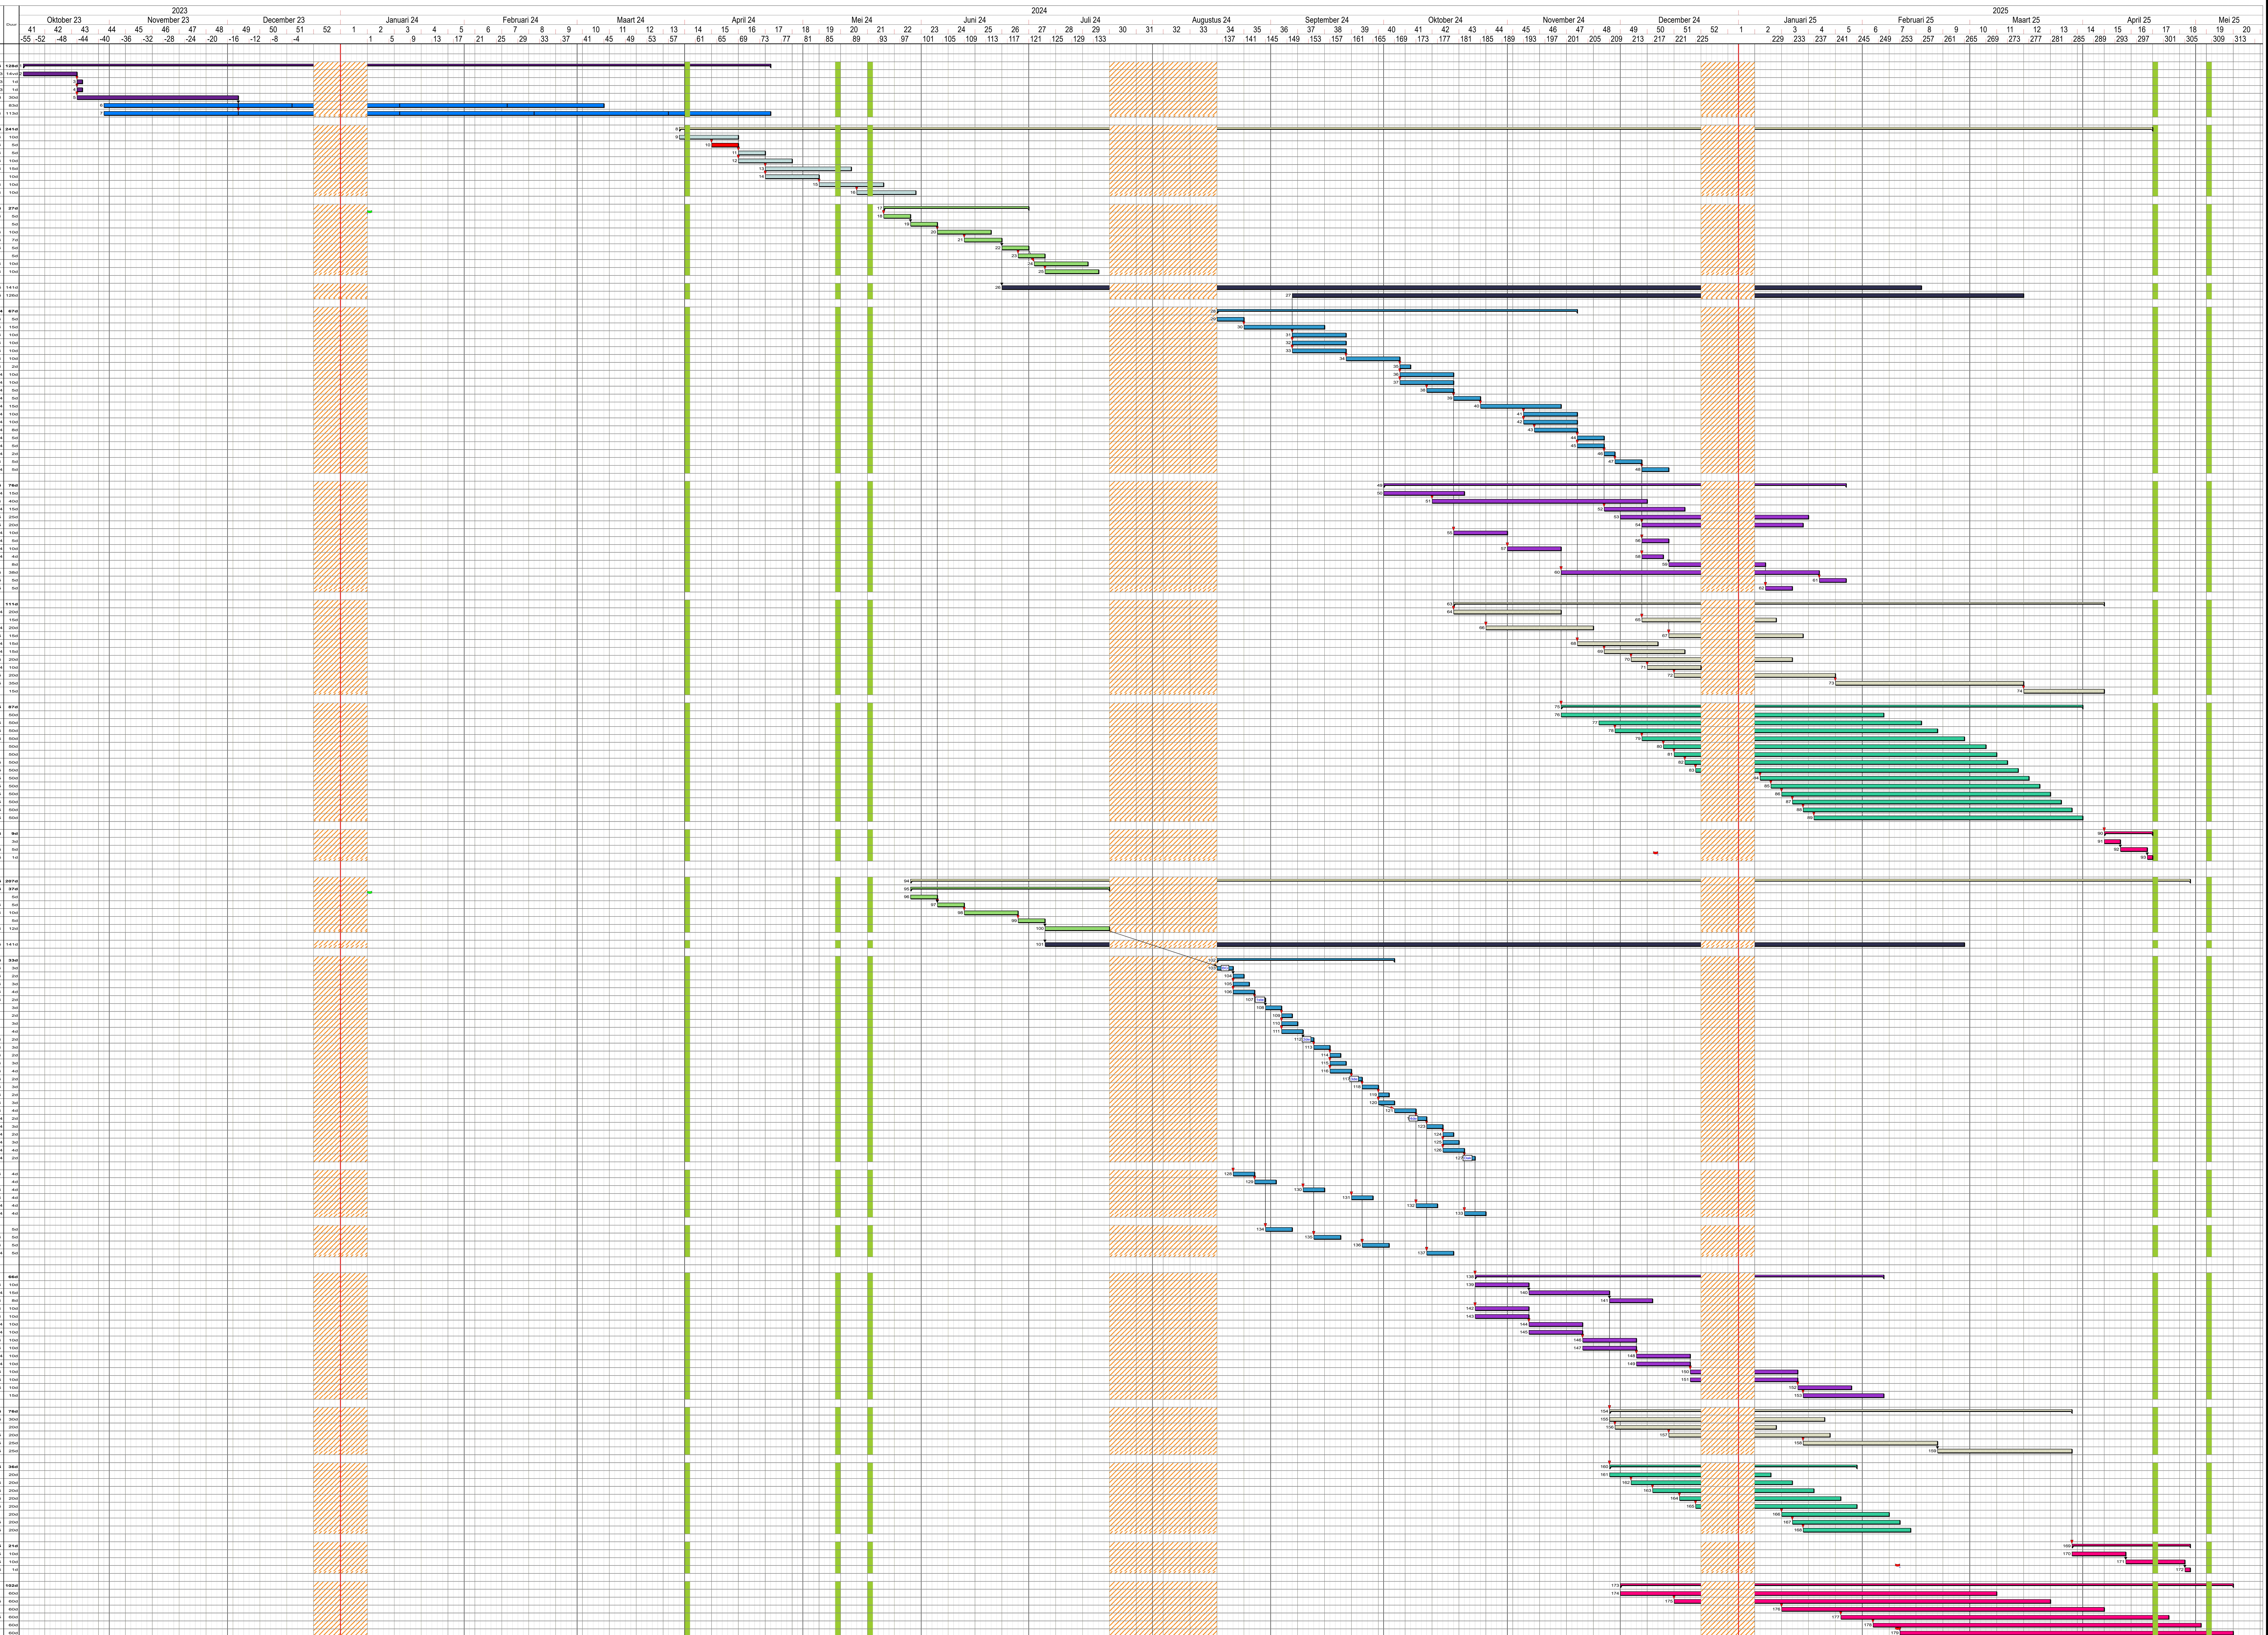

Renvooi
Opdrachtgever | Werkvoorbereider | Samenvatting | Derden | Gegevens verstrekken | Ruwbouw onderbouw | Vink Bouw | Ruwbouw bovenbouw | Gevel en dak | Installaties | Afbouw | Opleveren

Rev. 2016-07
